



## **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Kubík, referent odboru ISM

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

### **2. TS služby s.r.o.**

se sídlem Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená **Ing. Františkem Laštovičkou**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Šustr, provozní pracovník

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 25509187

DIČ: CZ25509187

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 27-1295630257/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 28680

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto

## **Smlouvu o dílo č. 150822**

### **Čl. 1**

#### **Předmět plnění**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy řádně provést pro objednatele dílo „**Úprava přechodu pro chodce Nové Město na Moravě – ul.Žďárská – pod nemocnicí**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. Závažnými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla jsou:
  - a) projektová dokumentace stavby ve stupni PDPS „Úpravy přechodů pro chodce v Novém Městě na Moravě, SO 103 Přechod pro chodce ul.Žďárská – pod nemocnicí“, vypracovaná Ing. Šárkou Vrbovou, Borodinova 309/4, 623 00 Brno, v 11/2013, včetně dokladové části a výpočtů;
  - b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Úprava přechodu pro chodce Nové Město na Moravě – ul.Žďárská – pod nemocnicí“ (projektová a textová část vč. výkazu výměr) předaná uchazeči(ům) objednatelem jako zadavatelem v rámci zadávacího řízení (dále také jen „zadávací dokumentace“);

- c) podmínky poskytnutí nadačního příspěvku, uvedené v přílohách č.1 až 3 Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku OP 08\_15, které tvoří přílohu č.2 této smlouvy;
- d) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a krycího listu;
- e) pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;
- f) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;
- g) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto částem byly vypracovány.

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru.

5. Součástí díla je rovněž:

- a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle projektové dokumentace;
- b) provedení kontrolního měření osvětlení chodce na přechodu z obou směrů jízdy (luxmetrem nebo jasovou analýzou pomocí digitální fotografie) ověřující splnění podmínek dle TKP 15 – dodatku č.1 vč.předání příslušného dokladu;
- c) vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby (výškopisného i polohopisného stavu) do digitální technické mapy města, grafická část ve formátu dgn nebo shp a pdf, textová část ve formátu doc a pdf, dle vyhlášky města Nové Město na Moravě č. 2/2015, o vedení digitální technické mapy města Nového Města na Moravě a jeho předání objednateli a současně správci digitální technické mapy města - Oddělení informatiky MěÚ Nové Město na Moravě v digitální a papírové formě;
- d) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 3x v listinné podobě a 1x v digitální formě na CD;
- e) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby, která je předmětem díla, do trvalého provozu;
- f) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném znění;
- g) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci;
- h) dodání fotodokumentace z průběhu stavby – v digitální podobě na CD ve formátu jpg;
- i) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;
- j) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- k) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby, která je předmětem díla, a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- l) zajištění bezpečného průchodu pro pěší a průjezdu vozidel od nemocnice a sídlišť směrem do centra města po celou dobu provádění prací.

6. Další podmínky realizace stavby, která je předmětem díla:

- a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření.
- b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, skládky materiálu, zeleně, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.
- c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení, atd.).
- d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.
- f) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele.
- g) dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru.
- h) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů v rámci povolovacího řízení, zadavatel požaduje komplexní dodávku stavby.
- i) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti zásobování, svozu odpadu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.).
- j) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a sousedních konstrukcí stávajícího objektu a v případě zjištění poruch, závad apod. na tuto skutečnost neprodleně upozornit objednatele.
- k) objednatel nemá v prostoru staveniště k dispozici odběrná místa vody, el.energie, ani jiných médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními silami a ve vlastní režii.
- l) objednatel je oprávněn rozhodnout o ponechání některých prvků a materiálů, které nebudou odpadem, pro vlastní potřebu.
- m) dílo musí být provedeno v souladu s podmínkami poskytovatele nadačního příspěvku, které jsou uvedeny v příloze č.2 této smlouvy, zejména:
  - technické a bezpečnostní specifikace sloupů a výložníků musí odpovídat technickým, bezpečnostním kritériím, m.j. dle přílohy č.2 této smlouvy
  - barva sloupu, výložníku a souvisejících upevňovadel musí být RAL 2004 – oranžová
  - na každý sloup osvětlení přechodu bude umístěn 1 ks informativní tabule o rozměru 200 x 600 mm z plechu určeného pro dopravní značení se zaoblenými okraji s oboustranným nereflexním polepem z řezané reklamy dle přílohy č.2 této smlouvy. Logo na polepu musí odpovídat logomanuálu

společnosti Nadace ČEZ, výňatek z nějž tvoří přílohu č.3 této smlouvy. Umístění informativních tabulí musí být provedeno dle přílohy č.2 této smlouvy.

- n) návrhy informativních tabulí i příp. dalších prvků související s publicitou a nadačním příspěvkem musí být před jejich výrobou a osazením zaslány alespoň 7 pracovních dnů předem objednateli k jejich odsouhlasení poskytovatelem nadačního příspěvku.
7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při realizaci díla přibýly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.
8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil a má ho připraven na skladě.
9. Dopady změn uvedených v čl. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:
- se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
  - zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.
10. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.
11. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.

## **Čl. 2** **Doba plnění**

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 22.09.2015. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne **12.10.2015**.
2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v den zahájení realizace díla.



3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla či jeho části se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

### **Čl. 3 Místo plnění**

Místem plnění a předání díla je k.ú. Nové Město na Moravě – prostor stavby dle specifikace v projektové dokumentaci.

### **Čl. 4 Cena díla**

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **109.361,38 Kč bez DPH**,  
(dále jen „cena“).  
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.  
**Při současně platné sazbě DPH 21% činí cena vč.DPH 132.327,-- Kč.**

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

2. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla, specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel zaručuje úplnost svého nabídkového položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
3. Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž krycí list a nabídkový položkový rozpočet je přílohou č.1 a součástí této smlouvy, a může být změněna v případech uvedených v čl. 4 odst. 4 této smlouvy.
4. Cena může být změněna pouze v případě, pokud dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu plnění proti smlouvě o dílo.
5. Při vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a nahradí se novou cenou, která bude určena takto:
- a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele;
  - b) položkami ceníků RTS sníženými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout;
  - c) pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a) a b), pak hodinovou sazbou ve výši 220,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu;

nebo budou nižší.

6. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.
7. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných prací.
8. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

## **Čl. 5**

### **Platební podmínky**

1. Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací, fakturu – daňový doklad (s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1. – 5. dne následujícího po měsíci, kdy byly práce provedeny. Přílohou každé faktury – daňového dokladu musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol. Poslední faktura – daňový doklad bude označena jako faktura konečná.
2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací protokoly (dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného číselného označení). Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 10 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedorazí k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.
3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve.
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
5. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně vystavených zhotovitelem.

6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
7. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
8. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této smlouvy.
9. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývajících část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu za podmínek, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky a dílo bude uvedeno řádně do provozu. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývajících část do 30 dnů po odstranění posledního z nich.
10. Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši 90% sjednané ceny, uhradí objednatel zhotoviteli pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% sjednané ceny, a zbývajících část faktury uhradí v souladu s ustanovením čl.5, odst. 9 této smlouvy.
11. Objednatel souhlasí, aby zhotovitel namísto měsíční fakturace vystavil jednu celkovou fakturu po dokončení díla, přičemž ostatní výše uvedené podmínky se použijí přiměřeně.
12. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu či upřesnění platebních podmínek a fakturace tak, aby tyto byly v souladu s podmínkami poskytnutí nadačního příspěvku.

## **Čl. 6 Součinnost objednatele**

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. 2 odst. 2 této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí apod. a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků příslušných řízení.
3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku.

## **Čl. 7**

### **Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace**

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.
2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.
4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 4 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady nejpozději do 10 dnů po doručení reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.
5. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady ve lhůtách dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.
6. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.
7. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.
8. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smlouvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.

## **Čl. 8**

### **Podmínky provedení díla**

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků,



jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
4. Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst. 1, písm. c) občanského zákoníku.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí bez písemného souhlasu objednatele měnit.
6. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.
7. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.
8. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činnostmi.
9. Zhotovitel se zavazuje, že stavba, která je předmětem díla, bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.
10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, které při realizaci díla způsobil.
11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.
12. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

13. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.
14. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.
15. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace zřetelně zakreslovat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, způsobem podle předpisů pro zhotovení stavebních výkresů, a to ihned po jejich provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.
16. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve dílčími předávacími protokoly
17. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla.
18. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území ve frekventované části města. Zhotovitel je povinen:
  - a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvlášť ohleduplně a opatrně,
  - b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
  - c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná škoda jde k tíži zhotovitele,
  - d) vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů, průchod pěších a průjezd vozidel,
  - e) dodržovat při provádění díla limity pro hluchnost podle hygienických předpisů
  - f) veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech k tomu určených na základě povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel.
19. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
20. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných zakázkách v platném znění a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od

jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto údajů dle tohoto zákona.

21. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat.

## **Čl. 9**

### **Stavební deník a kontrolní dny**

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen „deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.
2. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Zápisy do deníku jsou oprávněni kromě jiného činit zástupci zhotovitele dle preambule této smlouvy včetně technického dozoru stavebníka a autorský dozor. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu.
3. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.
4. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.
5. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

## **Čl. 10**

### **Předání a převzetí díla**

1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě kde se dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě převímacího řízení mezi smluvními stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.
2. Nejpozději 5 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému dozoru stavebníka e-mailem den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě projednají

smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.

3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo (není dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevzme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel. Zápis obsahuje zejména:
  - údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
  - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
  - popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
  - dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek
  - prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.
6. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělků, bude součástí zápisu o předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění a dohoda o zpřístupnění prostor pro jejich odstraňování. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělků.
7. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělků a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělků musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělků i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělků neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.
8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je předmětem díla, zejména:
  - a) projekt skutečného provedení stavby;
  - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze;
  - c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a zaškolení obsluhy;
  - d) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních deníků;
  - e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
  - f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy.Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.
9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.



## **Čl. 11**

### **Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu**

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.
2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná pohroma, apod.) na prováděném díle.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku objednatele. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj dílo provádějí.

## **Čl. 12**

### **Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty**

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
  - a) nezačátek prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 5 pracovních dnů od sjednaného termínu zahájení prací;
  - b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů;
  - c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.
2. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl.6 této smlouvy ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.
4. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
  - a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí;
  - b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení;
  - c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;
  - d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení;
  - e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení;

- f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení;
  - g) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou jednotlivou, objednatelem neodsouhlasenou změnu;
  - h) při neoznačení stavby dle čl. 1 odst. 6 písm. f) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně označena;
  - i) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem uvedeným v čl.15, odst.1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč.
5. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

### **Čl. 13 Vyšší moc**

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.
2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

### **Čl. 14 Změna závazku**

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

### **Čl. 15 Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob, a to po celou dobu realizace díla. Kopii dokladu o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 7 dnů od data, kdy jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.

2. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
3. Odpovědným zástupcem zhotovitele podle ust. § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je Ing. František Laštovička.
4. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
5. Dílo je spolufinancováno z nadačního příspěvku Nadace ČEZ v rámci grantového řízení Oranžový přechod 2015 – projekt „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže ve městě Nové Město na Moravě“. Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se stavbu provést v takové kvalitě a rozsahu (vč. potřebných dokladů), aby byly splněny veškeré požadavky a podmínky pro čerpání nadačního příspěvku.

## **Čl. 16**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy. V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla objednatele.
3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.
4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, data narození obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech objednatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či dodatek následně schválí.
10. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k této smlouvě.
11. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 6.schůzi konané dne 20.04.2015 pod č.usnesení 47/6/RM/2015.
12. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č.1 – Krycí list nabídky a nabídkový položkový rozpočet zhotovitele  
Příloha č.2 – Podmínky poskytnutí nadačního příspěvku – přílohy č. 1, 2 a 3 Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku OP 08\_15  
Příloha č.3 – Výňatek z kapitoly Firemní značka logomanuálu společnosti Nadace ČEZ
13. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Novém Městě na Moravě  
dne - 7. 09. 2015

V Novém Městě na Moravě  
dne 11.8.2015

Za objednatele:



Michal Šmarda  
starosta



Za zhotovitele:

TS služby s.r.o.  
Soškova 1346  
592 31 Nové Město na Moravě  
☎ 566 598 800 DIČ: CZ25509187



Ing. František Laštovička  
jednatel



**Krycí list nabídky a  
nabídkový položkový rozpočet zhotovitele**



# KRYCÍ LIST NABÍDKY

zakázka **Úprava přechodu pro chodce Nové Město na Moravě - ul.Žďárská - pod nemocnicí**

zadavatel **MĚSTO Nové Město na Moravě**  
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě  
IČ: 00294900

uchazeč **TS služby s.r.o.**  
sídlo **Soškova 1346**  
**592 31 Nové Město na Moravě**  
IČ **25509187** DIČ **CZ25509187**  
plátce DPH (uveďte ANO x NE) **ANO**  
telefon, fax **606646830**  
e-mail [petr.sustr@ts.nmm.cz](mailto:petr.sustr@ts.nmm.cz)  
datová schránka **24k8m4n**  
pověř.zástupce pro další jednání: **Petr Šustr**

**nabídková cena**

**s DPH**

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| dle orientačního položkového výkazu výměr: | <b>132 327,00</b> |
|--------------------------------------------|-------------------|

**ostatní:**

(doplňte příp.další konkrétní položky, které jsou nutné pro řádné plnění díla; v případě potřeby je možné doplnit vlastní dílčí položkový rozpočet formou přílohy tohoto krycího listu a zde doplnit pouze souhrnnou cenu dle takového dílčího rozpočtu)

|  |             |
|--|-------------|
|  | <b>0,00</b> |
|  | <b>0,00</b> |
|  | <b>0,00</b> |
|  | <b>0,00</b> |
|  | <b>0,00</b> |

**celkem**

(tato cena bude vložena do nabídky  
el.systému E-ZAK na profilu zadavatele.  
<https://zakazky.nmm.cz/>)

**132 327,00 Kč**

termín zahájení  
termín dokončení

**22.9.2015**

**12.10.2015**

poznámky:

datum  
podpis, razítko

**11.8.2015**

**TS služby s.r.o.**

Soškova 1346

592 31 Nové Město na Moravě

☎ 566 598 800 DIČ: CZ25509187

**Ing. František Laštovička**  
jednatel







## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                        |                                                         |        |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| Objekt :               | Název objektu :                                         | JKSO : |
| SO 103                 | <i>přechod pro chodce - ul. Žďárská - pod nemocnicí</i> |        |
| Stavba :               | Název stavby :                                          | SKP :  |
|                        | <i>Úprava přechodu pro chodce</i>                       |        |
| Projektant :           | Počet měrných jednotek :                                | 0      |
| Objednatel :           | Náklady na MJ :                                         | 0      |
| Počet listů :          | Zakázkové číslo :                                       |        |
| Zpracovatel projektu : | Zhotovitel :                                            |        |
|                        | TS služby s.r.o.                                        |        |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy | Vedlejší rozpočtové náklady |             |  |   |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|--|---|
| Dodávka celkem                      | 258                         |             |  |   |
| Z Montáž celkem                     | 71 826                      |             |  |   |
| R HSV celkem                        | 37 031                      |             |  |   |
| N PSV celkem                        | 247                         |             |  |   |
| ZRN celkem                          | 109 361                     |             |  |   |
| HZS                                 | 0                           |             |  |   |
| RN II.a III.hlavy                   | 109 361                     | Ostatní VRN |  | 0 |
| ZRN+VRN+HZS                         | 109 361                     | VRN celkem  |  | 0 |

|                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vypracoval        | Za zhotovitele                                                                                                                                                                           | Za objednatele                                                                                                                                               |
| Datum : 11.8.2015 | Jméno : <i>ing. LAŠTOVKA</i><br>Datum : 11.8.2015<br>Podpis : <i>[Signature]</i><br><br>TS služby s.r.o.<br>Soškova 1346<br>592 31 Nové Město na Moravě<br>☎ 566 598 800 DIČ: CZ25509187 | Jméno :<br>Datum : - 7. 09. 2015<br>Podpis : <i>[Signature]</i><br><br> |

|                              |             |                      |
|------------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro DPH               | 0 % činí :  | 0,00 Kč              |
| Základ pro DPH               | 15 % činí : | 0,00 Kč              |
| DPH                          | 15 % činí : | 0,00 Kč              |
| Základ pro DPH               | 21 % činí : | 109 361,38 Kč        |
| DPH                          | 21 % činí : | 22 966,00 Kč         |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |             | <b>132 327,00 Kč</b> |

Poznámka :



|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Úprava přechodu pro chodce</b>                      |
| Objekt : | <b>přechod pro chodce - ul.Žďárská - pod nemocnicí</b> |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|     | Stavební díl                | HSV           | PSV        | Dodávka    | Montáž        | HZS      |
|-----|-----------------------------|---------------|------------|------------|---------------|----------|
| 1   | Zemní práce                 | 1 296         | 0          | 0          | 0             | 0        |
| 5   | Komunikace                  | 11 740        | 0          | 0          | 0             | 0        |
| 99  | Staveništní přesun hmot     | 15            | 0          | 0          | 0             | 0        |
| 783 | Nátěry                      | 0             | 247        | 0          | 0             | 0        |
| M21 | Elektromontáže              | 0             | 0          | 258        | 64 852        | 0        |
| M46 | Zemní práce při montážích   | 0             | 0          | 0          | 6 975         | 0        |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 23 979        | 0          | 0          | 0             | 0        |
|     | <b>CELKEM OBJEKT</b>        | <b>37 031</b> | <b>247</b> | <b>258</b> | <b>71 826</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |



# Položkový rozpočet

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Uprava přechodu pro chodce</b>                      |
| Objekt : | <b>přechod pro chodce - ul.Žďárská - pod nemocnicí</b> |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                 | MJ    | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |                  | <b>Zemní práce</b>                                                            |       |          |           |                  |
| 1               | 167 10-1101.R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3                              | m3    | 1,50     | 185,50    | 278,25           |
| 2               | 171 20-1201.R00  | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m                            | m3    | 1,50     | 16,70     | 25,05            |
| 3               | 171201211        | Poplatek za uložení sypaniny                                                  | t     | 2,55     | 1,15      | 2,93             |
| 4               | 113106123        | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší                                          | m2    | 2,75     | 45,60     | 125,40           |
| 5               | 113107122        | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva                                    | m2    | 2,75     | 183,50    | 504,63           |
| 6               | 113202111        | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                   | m     | 3,00     | 62,00     | 186,00           |
| 7               | 113 20-4111.R00  | Vytrhání obrub záhonových                                                     | m     | 2,00     | 36,00     | 72,00            |
| 8               | 182 30-1124.R00  | Rozprostření ornice, svah, tl. 20-25 cm, do 500 m2                            | m2    | 1,00     | 102,00    | 102,00           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                          |       |          |           | <b>1 296,26</b>  |
| <b>Díl: 5</b>   |                  | <b>Komunikace</b>                                                             |       |          |           |                  |
| 9               | 564 85-1111.R00  | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm                              | m2    | 2,75     | 152,50    | 419,38           |
| 10              | 596 21-5021.R00  | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm                              | m2    | 2,75     | 247,50    | 680,63           |
| 11              | 914111111        | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1m2                                | ks    | 4,00     | 186,00    | 744,00           |
| 12              | 404442320R       | Značka svislá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm                                    | ks    | 4,00     | 1 304,00  | 5 216,00         |
| 13              | 915231112        | Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým pl                            | m2    | 9,00     | 375,00    | 3 375,00         |
| 14              | 915621111        | Předznačení vodorovného plošného značení                                      | m2    | 9,00     | 23,30     | 209,70           |
| 15              | 916131213        | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s                            | m     | 3,00     | 258,00    | 774,00           |
| 16              | 916331112        | Osazení obrubníku zahradního do betonového lože                               | ks    | 2,00     | 157,50    | 315,00           |
| 17              | 979024443        | Očištění vybouraných obrubníků                                                | m     | 3,00     | 1,15      | 3,45             |
| 18              | 979054451        | Očištění vybourané zámkové dlažby                                             | m2    | 2,75     | 1,15      | 3,16             |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                           |       |          |           | <b>11 740,31</b> |
| <b>Díl: 99</b>  |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                |       |          |           |                  |
| 19              | 997221551        | Vodorovná doprava suti                                                        | t     | 0,65     | 1,15      | 0,74             |
| 20              | 997221559        | Příplatek ZKD 1 km                                                            | t     | 2,58     | 1,15      | 2,97             |
| 21              | 997221855        | Poplatek za uložení odpadu                                                    | t     | 0,65     | 1,15      | 0,74             |
| 22              | 998229112        | Přesun hmot ruční                                                             | t     | 0,94     | 11,20     | 10,51            |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                             |       |          |           | <b>14,96</b>     |
| <b>Díl: 783</b> |                  | <b>Nátěry</b>                                                                 |       |          |           |                  |
| 23              | 783903211        | Nátěry elektrických zařízení systémy jednoslž. stožárů a výložníků do 6 m     | m2    | 2,00     | 62,00     | 124,00           |
| 24              | 783903310        | Nátěry elektrických zařízení systémy jednoslž. patic základní a 2x krycí      | m2    | 2,00     | 51,50     | 103,00           |
| 25              | 783903510        | Nátěry elektrických zařízení systémy jednoslž. zemních pásů 1xkrycí s proužky | m     | 1,00     | 19,80     | 19,80            |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>                                                             |       |          |           | <b>246,80</b>    |
| <b>Díl: M21</b> |                  | <b>Elektromontáže</b>                                                         |       |          |           |                  |
| 26              | 740991100        | Celková prohlídka el.rozvodu a zařízení                                       | soub. | 1,00     | 6 655,00  | 6 655,00         |
| 27              | 743131215        | Montáž trubka plastová ohebná D do 63 mm uložená                              | m     | 14,00    | 23,30     | 326,20           |
| 28              | 345713520        | Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063                                   | m     | 14,00    | 18,40     | 257,60           |
| 29              | 743611111        | Montáž vodičů uzem, FeZn páska D do 120mm                                     | m     | 14,00    | 69,50     | 973,00           |
| 30              | 3544206220       | Páska zemnicí                                                                 | kg    | 14,70    | 58,00     | 852,60           |
| 31              | 354419860        | svorka odbočovací SR 2                                                        | ks    | 1,00     | 30,00     | 30,00            |
| 32              | 743991100        | Meření zemních odporů                                                         | ks    | 2,00     | 1 664,00  | 3 328,00         |
| 33              | 744432200        | Montáž kabelů Cu sk. 2 uložený volně                                          | m     | 6,00     | 59,00     | 354,00           |
| 34              | 341095150        | Vodič CYKYLo 3x1,5 mm2                                                        | m     | 6,00     | 23,50     | 141,00           |
| 35              | 744432400        | Montáž kabelu Cu do sk.2                                                      | m     | 16,00    | 26,60     | 425,60           |
| 36              | 348341690        | svítidlo průmyslové 250W Hornet                                               | ks    | 2,00     | 4 860,00  | 9 720,00         |
| 37              | 347605100        | Výbojka halogenová                                                            | ks    | 2,00     | 795,00    | 1 590,00         |
| 38              | 748719211        | Montáž stožáru osvětlení                                                      | ks    | 2,00     | 2 440,00  | 4 880,00         |
| 39              | 316740680        | stožár osvětlovací                                                            | ks    | 2,00     | 7 045,00  | 14 090,00        |
| 40              | 316777360r       | Nádstavec pro zavěšení kabelu                                                 | ks    | 2,00     | 1 309,00  | 2 618,00         |
| 41              | 748721210        | Montáž výložníku                                                              | ks    | 2,00     | 738,00    | 1 476,00         |
| 42              | 210 80-0105.R00  | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2                                                    | m     | 16,00    | 25,60     | 409,60           |
| 43              | 748141131        | Montáž svítidel                                                               | ks    | 2,00     | 1 331,00  | 2 662,00         |
| 44              | 744432500        | Montáž kabelů CU sk.2                                                         | m     | 14,00    | 58,00     | 812,00           |
| 45              | 210 80-0114.RT1  | Kabel CYKY 750 V 4x16 mm2 včetně dodávky kabelu 4x16 mm2                      | m     | 14,00    | 207,50    | 2 905,00         |
| 46              | 744991211        | Zkouška izolační kabelů                                                       | ks    | 3,00     | 833,00    | 2 499,00         |
| 47              | 746211110        | Ukončení vodič izolovaný                                                      | ks    | 2,00     | 108,00    | 216,00           |



# Položkový rozpočet

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Uprava přechodu pro chodce</b>                      |
| Objekt : | <b>přechod pro chodce - ul.Žďárská - pod nemocnicí</b> |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                       | MJ    | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------------------|
| 48          | 746212110        | Ukončený vodič izolovaný na svorkovnici                             | ks    | 3,00     | 108,00    | 324,00           |
| 49          | 748719211        | Demontáž stožáru osvětlení                                          | ks    | 1,00     | 954,00    | 954,00           |
| 50          | 316770600        | Vyložník                                                            | ks    | 2,00     | 2 210,00  | 4 420,00         |
| 51          | 748741000        | Montáž elektrovýzbroje                                              | ks    | 2,00     | 166,50    | 333,00           |
| 52          | 357138500        | Rozvodnice stožárové                                                | ks    | 2,00     | 553,00    | 1 106,00         |
| 53          | 210 22-0361.R00  | Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m                         | kus   | 1,00     | 533,00    | 533,00           |
| 54          | 354420920        | Tyč zemnicí 1,5m FeZn                                               | ks    | 1,00     | 218,50    | 218,50           |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b>                                           |       |          |           | <b>65 109,10</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>M46</b>       | <b>Zemní práce při montážích</b>                                    |       |          |           |                  |
| 55          | 460 01-0024.R00  | Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru                       | km    | 0,02     | 2 110,00  | 42,20            |
|             |                  | Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy | ks    | 2,00     | 820,00    | 1 640,00         |
| 56          | 460 05-0703.RT1  | Základové konstrukce z monofilního betonu C25/30                    | ks    | 2,00     | 820,00    | 1 640,00         |
| 57          | 460 080012R      | Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3 ruční výkop rýhy                 | m     | 14,00    | 147,50    | 2 065,00         |
| 58          | 460 20-0133.RT2  | Lože kabelů z písku                                                 | m     | 14,00    | 56,50     | 791,00           |
| 59          | 460421101        | Krytí kabelů výstražnou folií                                       | m     | 14,00    | 23,30     | 326,20           |
| 60          | 460490011        | Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy               | m     | 14,00    | 20,10     | 281,40           |
| 61          | 460 56-0133.RT1  | Vodorovné přemístění horniny                                        | m3    | 1,50     | 52,00     | 78,00            |
| 62          | 460600021        | Příplatek k vodorovnému přemístění                                  | m3    | 7,50     | 14,80     | 111,00           |
| 63          | 460600031        | <b>Celkem za</b>                                                    |       |          |           | <b>6 974,80</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>VRN</b>       | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>                                  |       |          |           |                  |
| 64          | 012303000        | Geodetické práce                                                    | soub. | 1,00     | 6 105,00  | 6 105,00         |
| 65          | 013254000        | Dokumentace skutečného provedení                                    | soub. | 1,00     | 500,00    | 500,00           |
| 66          | 031103000        | Vybudování zařízení staveniště                                      | soub. | 1,00     | 1,15      | 1,15             |
| 67          | 032103000        | Provoz zařízení staveniště                                          | soub. | 1,00     | 1 054,00  | 1 054,00         |
| 68          | 034503000        | Veřejná publicita                                                   | soub. | 1,00     | 12 435,00 | 12 435,00        |
| 69          | 039103000        | Rozebírání,bourání a odvoz zařízení staveniště                      | soub. | 1,00     | 1 109,00  | 1 109,00         |
| 70          | 043203000        | Měření bez rozlišení                                                | soub. | 1,00     | 2 775,00  | 2 775,00         |
| 71          | 049103000        | Neobsazeno                                                          | soub. | 1,00     |           |                  |
| 72          | 049203000        | Neobsazeno                                                          | soub. | 1,00     |           |                  |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>                              |       |          |           | <b>23 979,15</b> |

## **Základní podmínky poskytnutí nadačního příspěvku**

- přílohy č. 1, 2 a 3 Smlouvy o poskytnutí nadačního  
příspěvku OP 08\_15

## Příloha č. 1

Seznam závazných právních norem pro realizaci projektu osvětlení přechodu pro chodce podpořeném na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.

### Normy

ČSN CEN/TR 13201-1: Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Výběr tříd osvětlení  
ČSN EN 13201-2: Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky  
Technické kvalitativní podmínky (TKP) staveb pozemních komunikací – Kapitola 15: Osvětlení pozemních komunikací včetně dodatku č.1: Přisvětlování přechodů  
ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory  
ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice  
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem  
ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům  
ČSN 33 2000-4-481 Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů  
ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy  
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení  
ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje. Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání  
ČSN 33 2000-5-54 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování  
ČSN 33 2000-7-714 Zařízení pro venkovní osvětlení  
ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize  
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

### Zákony a vyhlášky platné v ČR:

Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon v aktuálním znění  
Zákon 458/2000 O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)  
Zákon 670/2004 Zákon, kterým se mění zákon c. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů  
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  
Vyhl. CÚBP c. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky CÚBP a CBÚ c. 324/1990 Sb., vyhlášky CÚBP č. 207/1991 Sb., nar. vlády c. 352/2000 Sb., vyhl. c. 192/2005 Sb. a vyhl. 192/05 Sb.

## Příloha č. 2


Specifikace sloupů – nosičů osvětlení přechodů a informativních tabulí na nich umístěných pro realizaci projektu osvětlení přechodu pro chodce podpořeném na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.

### Sloupy a výložníky:

Technické a bezpečnostní specifikace musí odpovídat technickým, bezpečnostním kritériím, mj., dle přílohy 1.

Barevnost svislého sloupu, vodorovného výložníku a souvisejících upevňovadel:  
Oranžová RAL 2004

Barevnost pláště samotného osvětlovacího tělesa vyplývá z dodávky výrobcem.

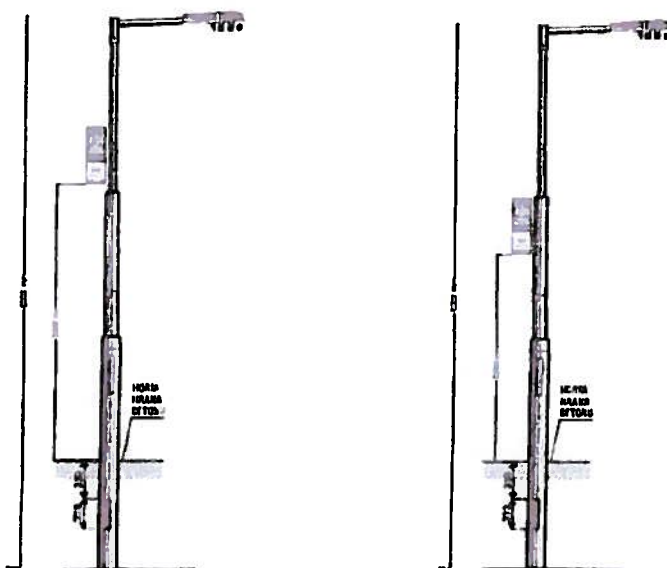

- **Informativní tabule a její umístění na svislý sloup:**
- umístění na oba svislé sloupy (1 přechod = 2 sloupy = 2 tabule)
- výroba z plechu určeného pro dopravní značení, zaoblené okraje
- umístění bočním uchycením (směrem od komunikace kolmo na komunikaci) pomocí ocelové pásky a spon
- oboustranný nereflexní polep z řezané reklamy
- rozměry tabule 200 x 600 mm
- umístění spodního okraje ve výšce od 2,2m (doporučeno) do max. výšky 3m
- dopravní značky se umísťují se spodním okrajem ve výšce 1,5 – 2,2 m. Tam, kde budou na stejném sloupu umístěny dopravní značky, budou informativní tabule umístěny nad dopravní značkou



### **Příloha č. 3**

#### **Vyúčtování nadačního příspěvku – povinné přílohy**

Vyúčtováním nadačního příspěvku se rozumí zaslání Závěrečné hodnotící zprávy, Tabulky evidence čerpání spolu s povinnými přílohami (tj. kopiemi daňových dokladů včetně příloh zejména dodavatelského položkového rozpočtu, dokladů o platbě, fotografiemi a souhlasného stanoviska příslušného orgánu Policie České republiky, světelně-technického výpočtu osvětlení chodce na přechodu dle TKP 15 – dodatku č.1, jehož součástí bude kontrolní měření osvětlení chodce na přechodu z obou směrů jízdy (luxmetrem nebo jasovou analýzou pomocí digitální fotografie) ověřující splnění podmínek dle TKP 15 – dodatku č.1) na adresu nadace nejpozději do 365 dnů od podání žádosti.

O stavu vyúčtování/prokázání řádného čerpání nadačního příspěvku budou příjemci nadačního příspěvku informováni e-mailem bezprostředně po kontrole doručených podkladů

**Výňatek z kapitoly Firemní značka  
logomanuálu společnosti Nadace ČEZ**





**Výňatek z kapitoly Firemní značka  
logomanuálu společnosti Nadace ČEZ**



## značka Nadace ČEZ


Značka Nadace ČEZ je základním stavebním kamenem celého jednotného vizuálního stylu.


Značku tvoří dvě části:

- (1) symbol tří stylizovaných postav držících se kolem ramen
- (2) název nadace vysázený z verzálků písma Futura Demi

Prostá geometrie symbolu ve spojení s výraznou barevností evokují základní charakteristiky nadace: solidaritu, otevřenost, stabilitu a energii.

Značku používáme v případě prezentace Nadace ČEZ.





1




2



3



4



manuál jednotného vizuálního stylu Nadace ČEZ

## barevné provedení

Základní barevná verze značky je doporučena pro všechny aplikace na bílém nebo světlém podkladu (1).

Inverzní barevné provedení značky se aplikuje na libovolné tmavé barvě (2).

Čtverec v podkladu je pouze informativní a není součástí loga.

Základní barevná verze samotného symbolu se aplikuje totožně jak na bílém či světlém podkladu (3) tak na libovolné tmavé barvě (4).

1



2




3




4



5



6



manuál jednotného vizuálního stylu Nadace ČEZ

## černobílé provedení

Pozitivní černobílá verze značky vznikne převedením barevných prvků do černé barvy (1).

Tato verze značky se aplikuje na bílém či světle šedém podkladu.


Inverzní černobílá verze značky vznikne převedením barevných prvků do bílé barvy (2).

Tato verze značky se aplikuje na tmavě šedém či černém podkladu.


Stejně se tvoří a aplikuje i pozitivní (3) a negativní (4) černobílá verze samostatného symbolu.


Samostatný symbol (nikoli značku) lze použít ve světle šedém provedení (5–15% černá) (5) nebo ve světlešedé ploše (6) jako speciální verzi pro vytvoření dekorativního podtisku.



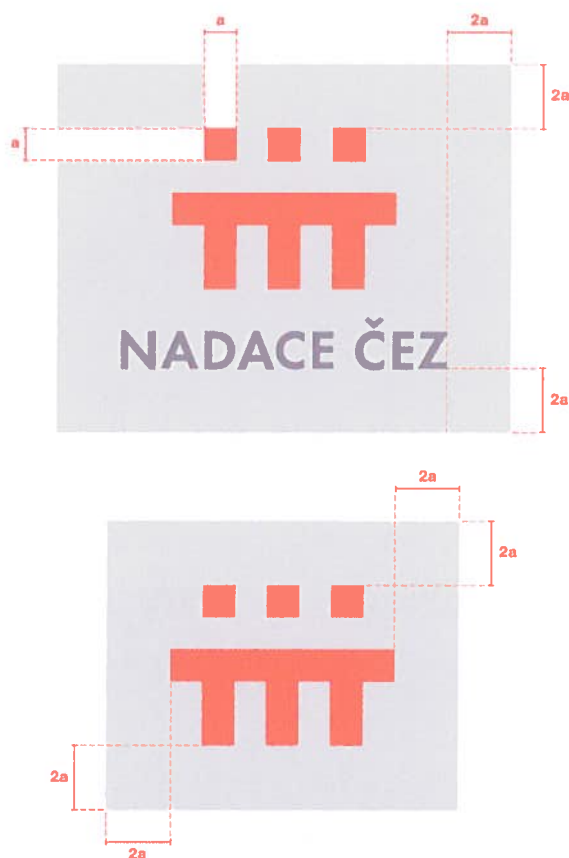

Ochranná zóna je definována jako dvojnásobek rozměru  $a$  ve všech směrech. Smyslem ochranné zóny je zajistit dostatečný odstup značky či samostatného symbolu od všech ostatních grafických prvků, které by mohly jedinečnost značky či samostatného symbolu opticky narušit. Ochranná zóna také slouží ke správnému umístění značky či samostatného symbolu na okraji formátu papíru apod. Ochranná zóna značky či samostatného symbolu umístěné na barevném podkladu však není v žádném případě bílý či jinak barevný podkladový obdélník kolem značky.





## značka na pozadí – jednobarevné plochy


Vyobrazení ukazuje použití pozitivní i negativní varianty barevné <sup>1)</sup> a černobílé <sup>2)</sup> značky na svítivých a tmavých klidných plochách. Je nutné dbět na dobrou čitelnost textové části značky.

Speciální variantou použití je značka na podkladu barvy PANTONE 172 <sup>3)</sup>.

Aplikace barevné verze značky na svítivých, pestrých či jinak rušivých barvách nejsou žádoucí <sup>4)</sup>.



problém



nesprávné řešení



vhodné řešení



manuál jednotného vizuálního stylu Nadace ČEZ

## značka na pozadí – fotografie

Umístění značky na nehomogenním podkladu, jakým je např. fotografie, se řídí základním pravidlem: **učtíte značku součástí obrazové kompozice tak, aby nebyla narušena její čitelnost.** Zaručení čitelnosti značky však nesmí v žádném případě vést k její modifikaci či k jejímu podkládání nevýraznou bílou plochou. Z ukázek je zřejmé, že lze vždy najít správné řešení: drobnou retuší fotografie (1), úpravou barevné saturace (2) či změnou výřezu (3). Přípustných způsobů řešení je ovšem mnohem více.
